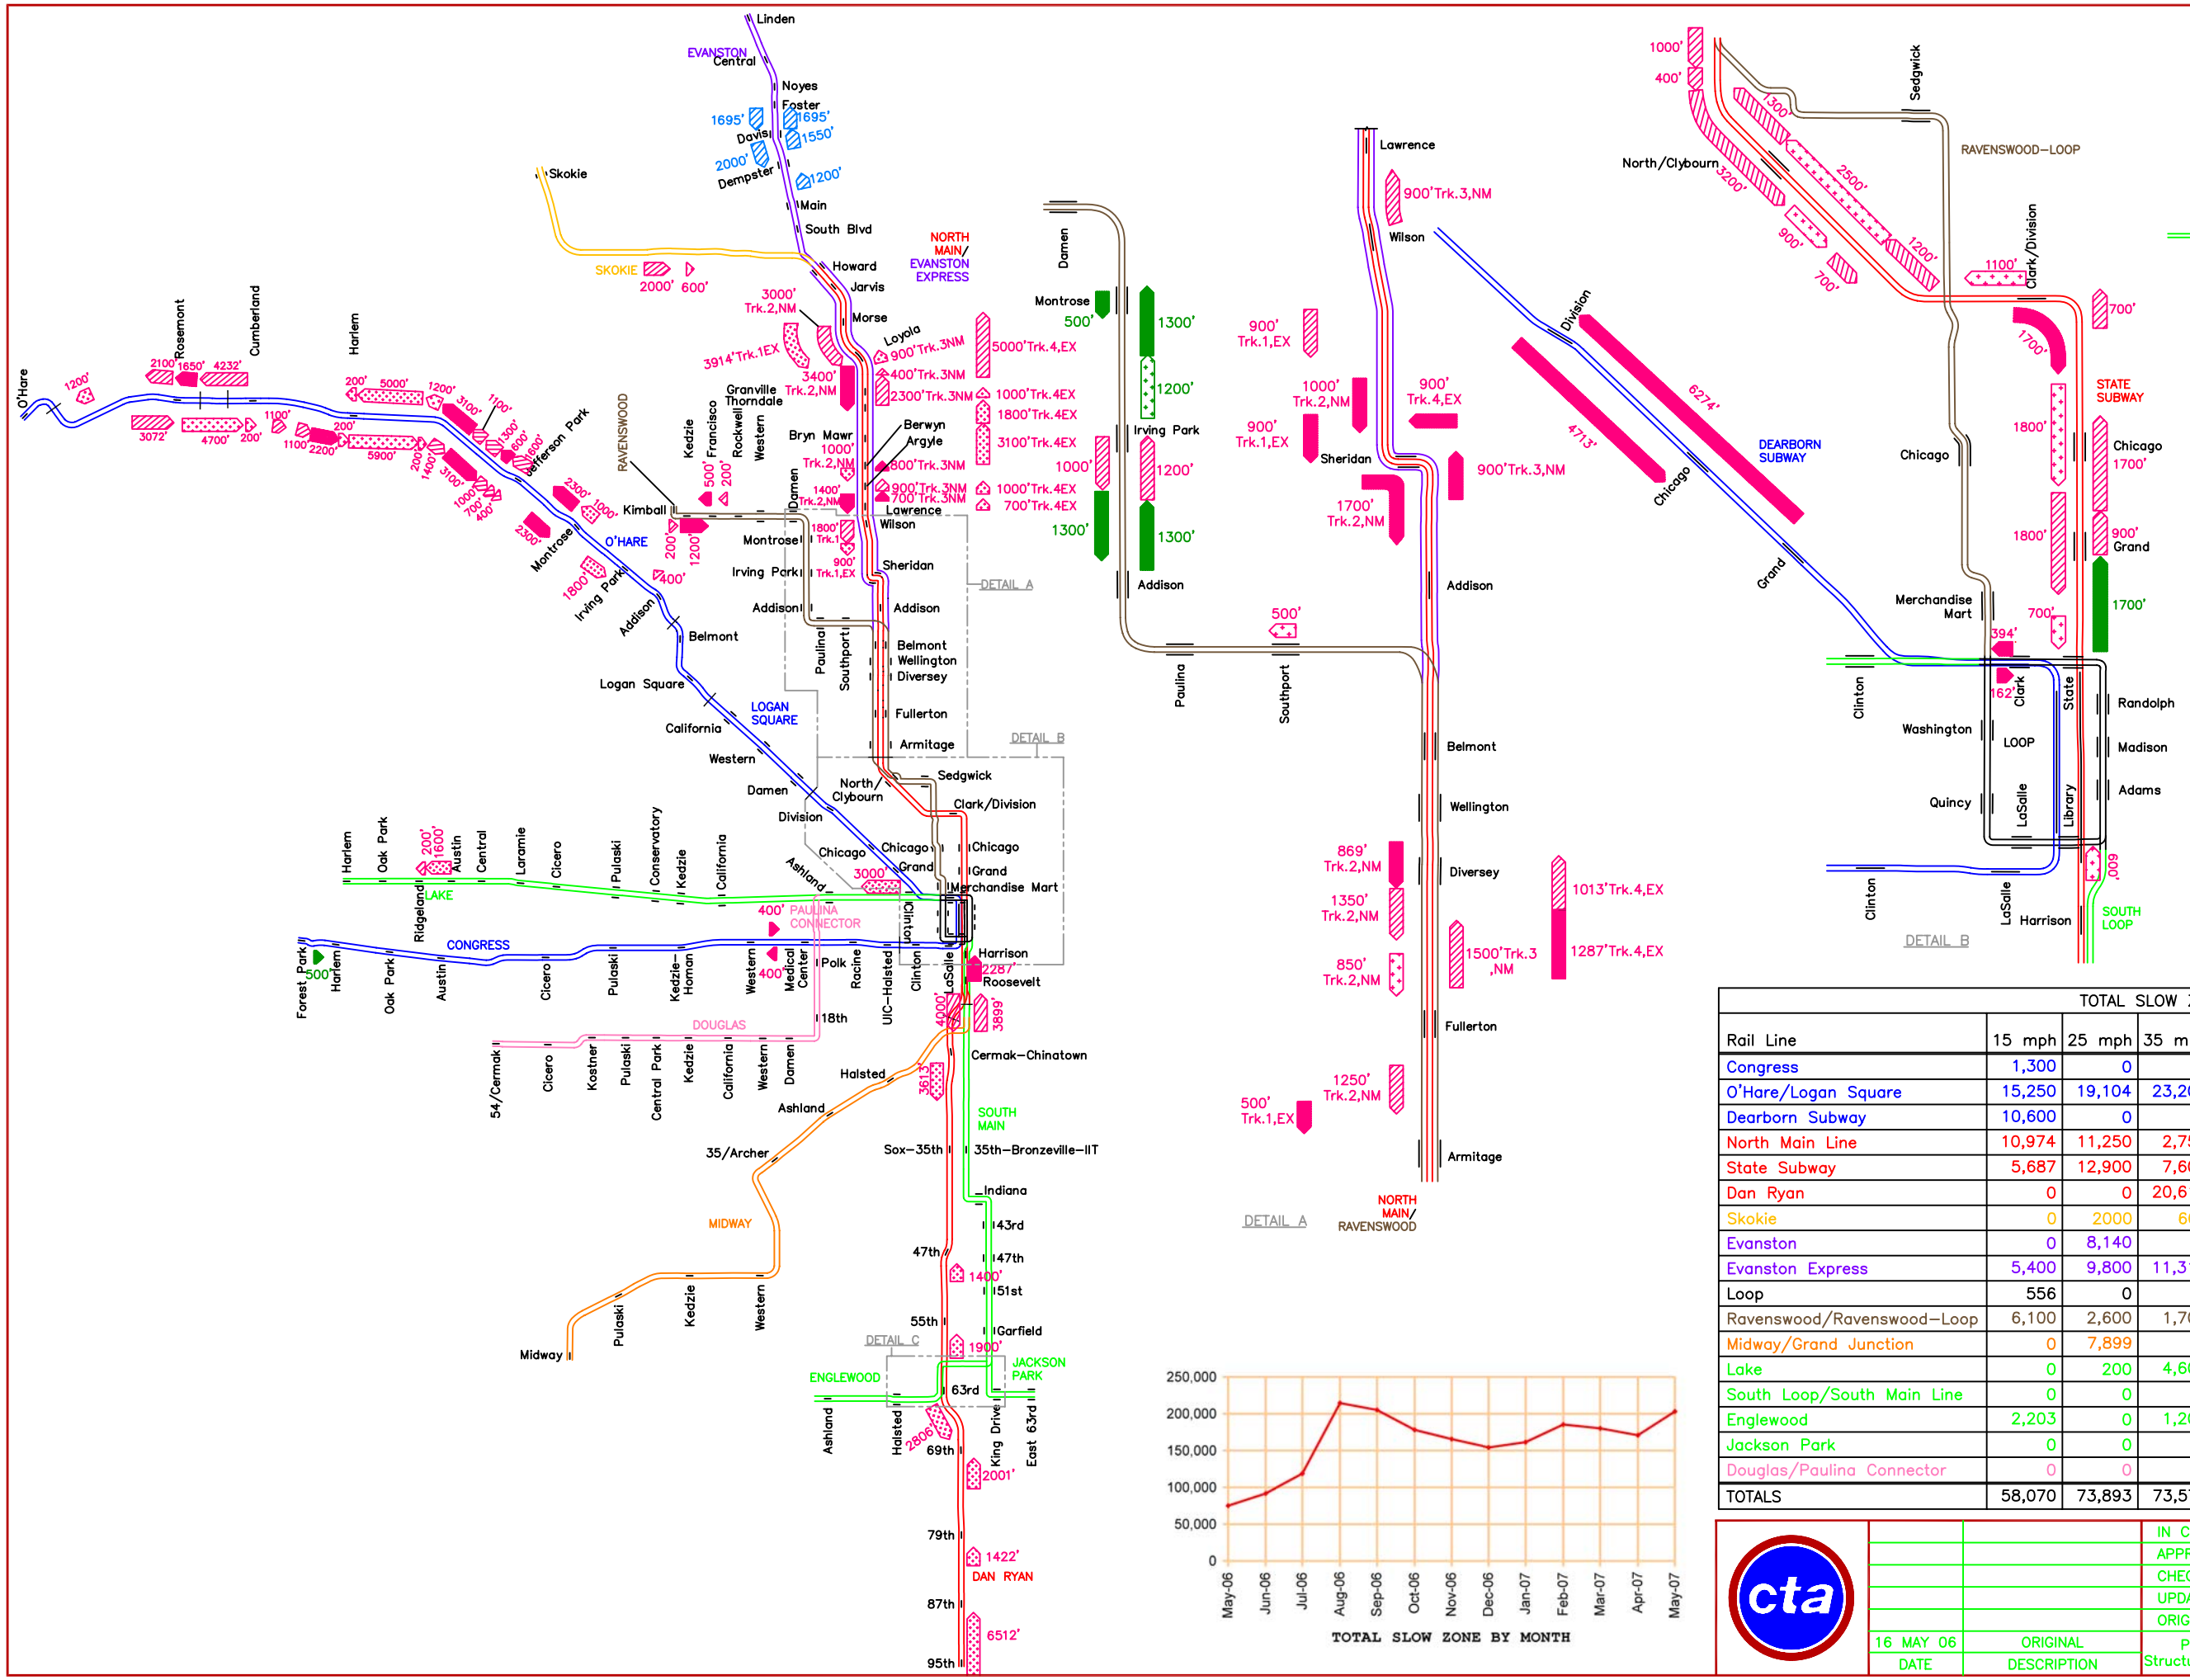

SLOW ZONE BY AREA				
Track (CTA)	15 mph	49,267	187,399	
	25 mph	65,753		
	35 mph	72,379		
Structure (CTA)	15 mph	2,203	10,343	
	25 mph	8,140		
	35 mph	0		
Signal (CTA)	15 mph	0	0	
	25 mph	0		
	35 mph	0		
Power (CTA)	15 mph	0	0	
	25 mph	0		
	35 mph	0		
Construction (Contractor)	15 mph	6,600	7,800	
	25 mph	0		
	35 mph	1,200		

TOTAL SLOW ZONE TRACK								
Rail Line	15 mph	25 mph	35 mph	Total Slow Zone	Linear Trk.–Ft.	% Slow	Total Slow Zone	% Slow
Congress	1,300	0	0	1,300	94,010	1.4	69,454	23.7
O'Hare/Logan Square	15,250	19,104	23,200	57,554	152,956	37.6		
Dearborn Subway	10,600	0	0	10,600	45,818	23.1		
North Main Line	10,974	11,250	2,750	24,974	78,966	31.6	71,776	31.0
State Subway	5,687	12,900	7,600	26,187	51,328	51.0		
Dan Ryan	0	0	20,615	20,615	101,332	20.3		
Skokie	0	2000	600	2600	52,146	5.0	2,600	5.0
Evanston	0	8,140	0	8,140	40,714	20.0	34,654	34.1
Evanston Express	5,400	9,800	11,314	26,514	60,970	43.5		
Loop	556	0	0	556	21,470	2.6	556	2.6
Ravenswood/Ravenswood–Loop	6,100	2,600	1,700	10,400	98,364	10.6	10,400	10.6
Midway/Grand Junction	0	7,899	0	7,899	99,224	8.0	7,899	8.0
Lake	0	200	4,600	4,800	93,114	5.2	8,203	4.0
South Loop/South Main Line	0	0	0	0	68,906	0		
Englewood	2,203	0	1,200	3,403	31,916	10.7		
Jackson Park	0	0	0	0	12,162	0		
Douglas/Paulina Connector	0	0	0	0	77,710	0	0	
TOTALS	58,070	73,893	73,579	205,542	1,181,106	17.4		

		IN CHARGE GCZ
		APPROVED BY DC
		CHECKED BY DC
		UPDATED BY SM
		ORIGINATED BY JJH
16 MAY 06	ORIGINAL	Prepared by: Structural Maintenance
DATE	DESCRIPTION	

CTA RAIL SLOW ZONE MAP

22 May 2007
